A4AI
Any For AI

A4AI 기획 보고 · 2026.10.16

A4AI의 제조 진출 방안

현장 데이터 활용과 제조 기반 준비

기획부 · 신입 사원 발표 · 약 22분



개념 이미지 (AI 생성)

오늘 말씀드릴 순서

현장 수요 → 진출 경로 → 지원사업 → 데이터 → 실행 계획

A4AI
Any For AI

01 **현재 제조 흐름 분석**
제조 AI 적용 범위와 진입 기회

02 **진출 경로와 초기 조건**
단계별 경로, 공장등록과 실제 역량

03 **공고 재선별과 과제 중복**
준비·시험 지원 후보, 걸러지는 이유, 업무 분리

04 **보유 데이터·VCM 활용**
음성·소음 데이터와 현장 작업기록

05 **시작 준비와 실행 계획**
준비사항, 10월 할 일, 6개월 계획


개념 이미지 (AI 생성)

제조 진출의 출발점

현장 문제를 좁히고, 검증과 제작 기반을 순서대로 준비

A4AI
Any For AI

직접 설비 투자는
수요·제작 범위·비용을 확인한 뒤 판단

1 현장 수요 확인

지금

제조기업의 실제 업무와
필요한 결과물을 먼저 정의

2 데이터 활용 검증

다음

현장 기록을 쌓고 다시 쓸 수
있는지 작은 범위에서 확인

3 제작 기반 확보

그다음

협력 제조·시험기관과 역할을
정한 뒤 시제품 단계 검토

단계는 앞 단계의 결과(수요처·검증 기록·견적)를 확인한 뒤에만 넘어갑니다

핵심 지금은 1단계 — 수요처 한 곳과 작업 한 종류를 정하는 것부터 시작

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

A4AI
Any For AI

01

현재 제조 흐름 분석

제조 AI가 어디까지 쓰이는지, 우리가 들어갈 업무는 어디인지



개념 이미지 (AI 생성)

제조 AI의 적용 범위

생산 설비를 넘어 설계·작업·물류·경영 업무까지 확대

A4AI
Any For AI

- 제조 AI는 생산 설비를 넘어 **설계·작업·물류·경영** 업무까지 넓어지는 중
- 범위가 넓어질수록 **"어느 업무부터"**를 먼저 정해야 함
- 정책 자료는 방향의 근거 — 실제 신청 가능 여부는 개별 공고로 판단 (부록 F)
- 설비 제어보다 사람이 하는 **작업** 영역에서 출발점 검토



정책 흐름	2026 스마트제조혁신 사업과 현장용 AI 솔루션 발굴 추진
현장의 요구	실제로 적용할 수 있는 업무와 솔루션 정보가 필요
공급기업의 과제	기술 소개와 함께 수요처 확보· 현장 적용성 입증

핵심 A4AI 검토 방향: 구체적인 현장 업무를 정한 뒤 진입 범위 선택

출처: 중소벤처기업부, 제조 AI 솔루션 공모전 보도자료 (2025.09.29) · 중소벤처기업부, 2026 스마트제조혁신 지원사업 통합공고

스마트제조혁신 중소벤처기업부가 중소 제조기업의 스마트공장·제조 AI 도입을 지원하는 사업 묶음

제조기업의 업무와 진입 기회

생산공정과 현장 업무 지원을 구분해서 접근

A4AI
Any For AI

업무 영역	필요한 현장 조건	초기 검토 방향	
설비 제어·자동화	실제 설비, 공정 지식, 안전·품질 검증	제조 파트너와 공동 검토	
검사·품질 분석	제품 시료, 불량 기준, 정답 데이터	수요처와 데이터 확보부터	
작업 기록·인수인계	작업 절차, 기록 양식, 사용자 참여	**작은 업무 단위에서 검증**	우선 가설
자재·물류 관리	품목·재고 데이터, 기존 시스템 연결	연계 범위와 운영 책임 확인	

초기 검토 방향은 정책 자료를 바탕으로 한 가설이며, 현장 수요 확인 전입니다

핵심 우선 가설: 작업 기록처럼 현장 진입 범위를 작게 정의할 수 있는 업무

출처: 중소벤처기업부, 제조 AI 솔루션 공모전 보도자료 (2025.09.29) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

A4AI
Any For AI

02

진출 경로와 초기 조건

한 번에 공장을 갖추기보다, 검증 결과에 따라 단계를 넘어갑니다



개념 이미지 (AI 생성)

현실적인 제조 진출 경로

현재는 1단계 준비, 검증 결과에 따라 다음 단계 검토

A4AI
Any For AI

1단계 현장 업무 검증

지금

회사 역할

데이터·소프트웨어 적용 범위 정의

진입 전에 필요한 것

- [ ] 수요처
- [ ] 현장 담당자
- [ ] 기록 양식
- [ ] 검증 계획

검증 결과 →

2단계 협력 시제품 제작

회사 역할

사양·통합·데이터 관리 담당

진입 전에 필요한 것

- [ ] 제작사 견적
- [ ] 설계 책임
- [ ] 시험 기준
- [ ] 운영 범위

검증 결과 →

3단계 자체 제작·설비

회사 역할

필요 공정의 직접 운영 검토

진입 전에 필요한 것

- [ ] 수주 전망
- [ ] 생산 인력
- [ ] 품질체계
- [ ] 투자 회수

설비·제조 진출은 수요와 검증이 쌓인 뒤 단계적으로 확대 — 각 단계의 체크 항목이 채워져야 다음 단계로

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

공장등록과 실제 제조 역량

등록은 준비 항목 중 하나이며, 생산 운영 조건은 별도로 확보

A4AI
Any For AI

항목	공장등록과의 관계	판단	현재 필요한 준비
행정상 사업장·업종	등록 내용과 실제 영위 업종을 일치	등록으로 정비	**등록 완료·증명서·해당 업종 확인**
제작·생산 운영	등록만으로 확보되지 않음	별도 확보	**제작 범위, 인력, 외주·내재화 구분**
품질·납품 증빙	등록증으로 납품 실적 대체 불가	대체 불가	**시험 기준·검수 절차·거래 증빙 축적**
지원사업 신청	공고별 요건을 각각 충족해야 함	공고별 대조	**지역·업력·역할·실적·중복 조건 대조**

공장등록은 준비 항목 중 하나 — 생산 운영 조건과 납품 증빙은 별도로 쌓아야 합니다

핵심 공장등록은 행정상 정비 — 제작 운영과 납품 증빙은 따로 쌓아야 지원 자격이 열림

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 경북테크노파크, 지역특화형 방산·모빌리티 스마트공장 공고·제출서류 · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

공장등록 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 제조시설을 지자체에 등록하는 절차
납품 증빙 납품내역서·거래확인서처럼 실제 거래가 있었음을 보여 주는 서류

A4AI
Any For AI

03

공고 재선별과 과제 중복

지금 조건에 맞는 공고만 다시 고르고, 진행 과제와 겹치는 부분을 나눕니다



개념 이미지 (AI 생성)

시작 준비에 맞는 지원사업

공고 기준일 2026.10.16 · 선정·잔여 물량은 별도 확인

A4AI
Any For AI

경북 AX랩 활용기업

우선 검토

주관·운영: 포항테크노파크

지원

AI 인프라·공간·교육·컨설팅

기간

상시 모집(3개사 내외), 협약 후 연말까지

확인할 것

제조 AX 사업화 계획·공간 활용 방식

잔여석과 현재 접수 여부(게시판 마감 표시 충돌)

구미 기업애로 원스톱 에이전트

확인 필요

주관: 구미전자정보기술원 · 지원: 구미시

지원

전문가 매칭·기획 지원 (최대 300만 원, 전문가에게 지급)

기간

10.30 마감, 조기 종료 가능

확인할 것

유사 정책자금 수행 기업·단순 서비스업 제외 조건

현재 과제·실제 업종과 대조 후 판단

회사에 현금을 주는 설비 구입 지원이 아니라, 기획·인프라를 쓰는 지원으로 구분해 봅니다

출처: 포항테크노파크, 경북AX랩 활용기업 모집 공고·신청서 · 구미전자정보기술원, 2026-294호 공고·신청서

AX AI 전환 — 업무에 AI를 들여 일하는 방식을 바꾸는 것

상시 모집 마감일 없이 받다가 정원·예산이 차면 끝나는 방식

기술지도·시험 지원 후보

개발할 제품과 시험 항목이 정해진 다음 검토

A4AI
Any For AI

온디바이스 AI 애로기술 지원

확인 필요

주관: 한국로봇융합연구원

지원

전문가 기술지도, 간접지원 (최대 500만 원)

기간

상시 접수·선정 시 종료, 수행 11.30까지

확인할 것

대상 산업·현장 애로의 연관성

최근 2년 동일제품·동일내용 지원 제외

공유공장 제조창업 시험지원

시료 준비 후

주관: FITI시험연구원 · 소관: 중소벤처기업부

지원

시험·평가 서비스

기간

11.30 마감, 4건 충원 시 종료 · 충북 우선, 타지역 가능

확인할 것

업력 5년 이내 제조창업기업 또는 중소기업

시료·시험계획, 기존 과제 시험비와 구분

현금 확보보다, 필요한 검증 업무와 지원 내용이 맞는지가 먼저입니다

출처: 한국로봇융합연구원, 2026-21호 애로기술 지원 공고·신청서 · FITI시험연구원, 공유공장 제조창업 시험지원 추가모집 공고

간접지원 회사에 현금을 주지 않고, 지원 비용을 전문가·수행기관에 지급하는 방식

애로기술 기업이 혼자 풀기 어려운 기술 문제

공고가 주로 걸러지는 이유

공장등록 외에도 실적·지역·사업 이력·준비 기간이 신청을 제한

A4AI
Any For AI

1	**필수 거래 증빙 없음** 경북 방산·모빌리티 스마트공장 · 경북테크노파크	**납품내역서·거래확인서('24~'25) 없음 → 신청 제외**
2	**지역·대상 기업 불일치** 대전 3D프린팅 · 대구 제조데이터 · 포항 스마트공장	**구미 소재 회사에 해당하지 않는 지역 조건**
3	**특정 선행 지원 이력 필요** Multi AI Agent Jump-up · 중소기업기술정보진흥원	**지정 스마트제조 선행과제 완료 이력 필요**
4	**이미 마감·준비 기간 부족** GERI 기술지원, 방산 컨설팅, K-AI 경북형 등	**10.23까지 마감은 이번 검토 제외 · 수행기간≠접수기간**
5	**신청 공고가 아닌 자료** 통합공고 · 수요조사 · 공급기업 Pool 안내	**개별 접수·자격 공고와 구분해서 관리**

주요 사례를 사유별로 묶은 것 — 전체 수집 공고의 사유별 통계는 아님


핵심 10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지) 공고는 준비 기간 부족으로 이번 검토에서 제외 — 다음 차수 대비

출처: 경북테크노파크, 지역특화형 방산·모빌리티 스마트공장 공고·제출서류 · 중소기업기술정보진흥원, 중소제조 특화 Multi AI Agent Jump-up Track 공고 · 대전테크노파크, 3D프린팅 시제품 제작지원 공고 · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개)

공급기업 Pool 정부 사업에서 기술을 공급할 수 있는 기업으로 미리 등록해 두는 명단

진행 과제와 신규 지원의 접점

참고자료 원문 기준 · 수행 중과 과거 완료·신청 상태를 구분

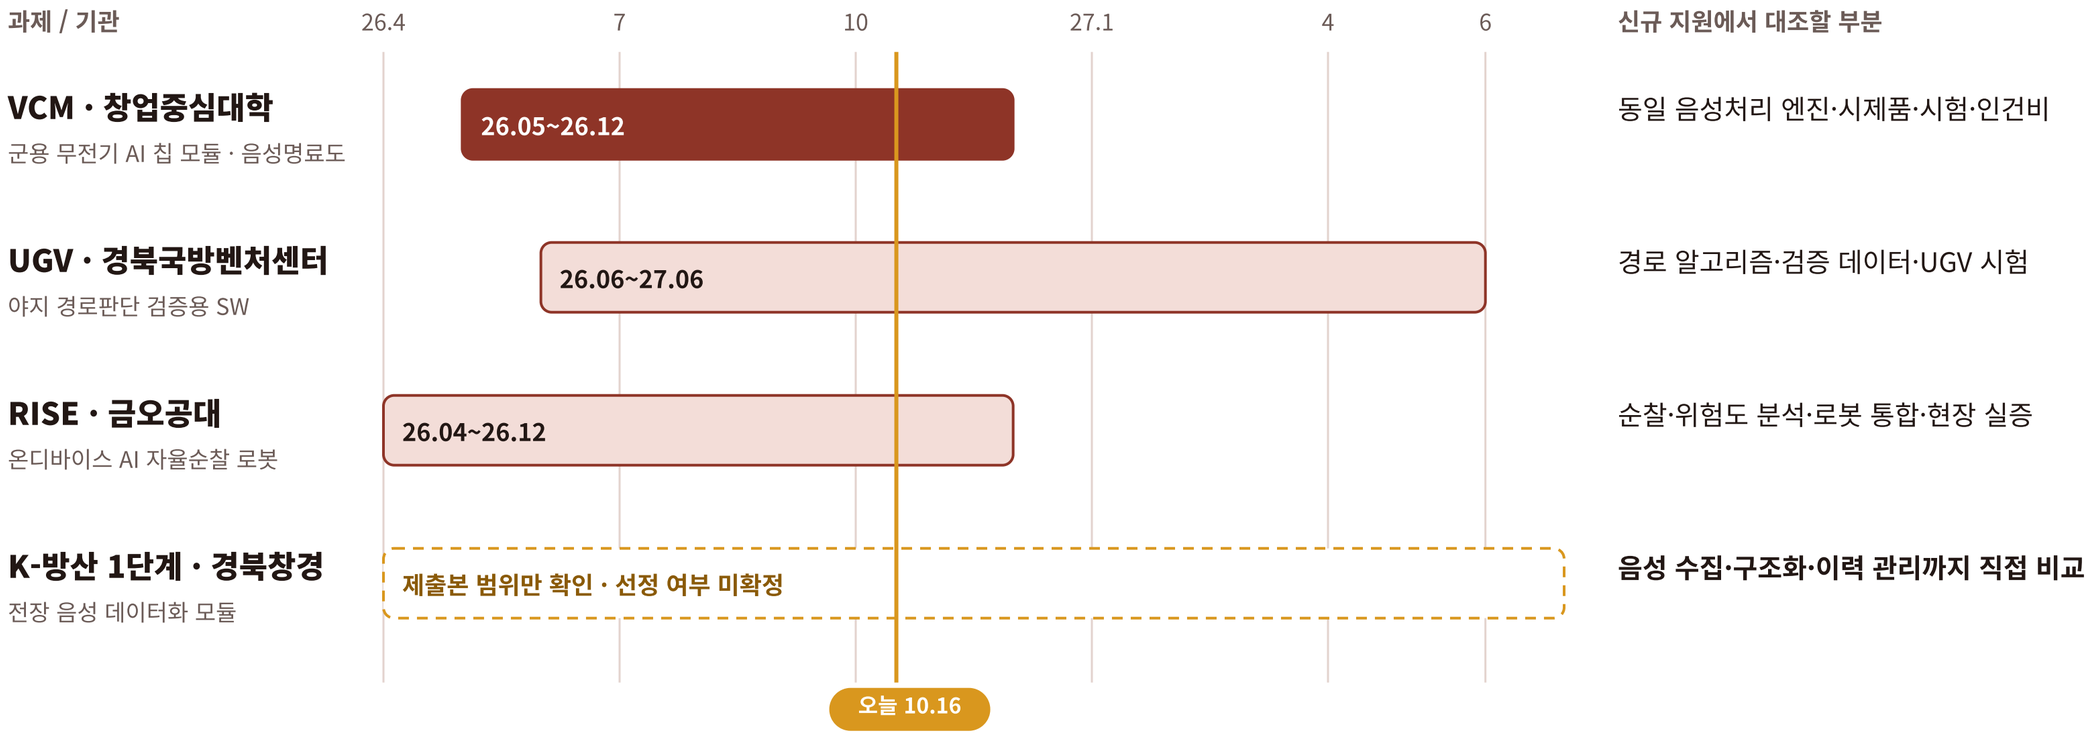

최종 중복 판정에는 최신 협약서·세부 예산·수행계획이 필요 · 완료 과제(RISE 드론·LiDAR, 초기창업패키지)는 부록 E

핵심 신규 신청의 "중복 없음" 확정에는 협약서·세부 예산·최신 수행계획이 필요

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개)

VCM VoiceClear-M — 군용 무전기용 음성명료도·소음감쇄 AI 칩 모듈 과제
RISE 지역혁신중심 대학지원체계 — 지자체·대학 연계 지원 사업

신규 신청 전의 업무 분리

기술·데이터 활용과 새 지원금으로 수행할 업무를 구분

A4AI
Any For AI

	기존 과제와 연결되는 부분	별도로 정의할 신규 업무
목적·산출물	음성명료도, 군용 모듈, 전장 데이터화	**제조 작업 양식·인수인계 흐름 검증**
데이터·권리	기존 음성·소음 데이터, 과제 생성 데이터	**사용 허용 범위 확인 후 현장 데이터 추가**
비용·인력	기존 엔진 개발, 시제품, 시험, 참여 인력	**추가 업무의 기간·인력·시험비만 별도 산정**
지원 제한	동일제품·동일내용, 유사 정책자금 조건	**공고별 조항에 맞춘 비교표와 문의사항**

대상 산업이나 과제 이름을 바꾸는 것만으로 중복이 해소되지 않습니다

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개) · 한국로봇융합연구원, 2026-21호 애로기술 지원 공고·신청서 · 구미전자정보기술원, 2026-294호 공고·신청서 · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

A4AI
Any For AI

04

보유 데이터·VCM 활용

이미 가진 음성·소음 데이터와 기술을 현장 기록으로 이어 봅니다



개념 이미지 (AI 생성)

보유 음성·소음 데이터의 활용

기존 데이터와 AI 기술을 제조 현장 검증의 기반으로 활용



1 현재 보유

음성·소음 데이터
관련 AI 개발 기반

VCM: 음성명료도·소음감쇄

2 점검

데이터별 권리·수집 조건
라벨·제조 현장 대표성

3 보완

실제 제조 환경에서
필요한 데이터만 추가

처음부터 새로 만들기보다, 목록화 → 점검 → 필요한 것만 보완

핵심 보유 데이터 목록화 후, 실제 제조 환경에서 필요한 데이터를 추가

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개)

대표성 모은 데이터가 실제 현장의 소음·말투·작업 상황을 고르게 담고 있는 정도

현장 음성 작업기록의 핵심

한 번 남긴 기록을 검색·인수인계·분석에 다시 활용

A4AI
Any For AI

01 수집

작업·설비·시간 정보와
음성 원본을 연결

→

02 확인

작업자가 내용 수정
수정 이유와 버전 보관

→

03 구조화

작업 단계·이상 상황·
조치 결과를 공통 양식화

→

04 재사용

검색·인수인계·추세 분석
허용된 범위의 학습 활용

함께 연결해 남기는 것

원음 — 작업 메타데이터 — 확인본 — 수정 이력

STT는 입력 수단 중 하나

원음과 확인된 기록을 연결하는 구조가 핵심 — 다음 근무자가 같은 상황을 다시 찾고 인계할 수 있어야 합니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

STT 음성을 글자로 바꾸는 기술
메타데이터 작업·설비·시간처럼 기록 자체를 설명하는 정보

VCM과 현장 기록의 연결

기존 과제의 기술 방향을 살리되, 신규 개발 범위는 별도 검증

	VCM 진행 범위		제조 현장 적용 검토
음성 입력	소음 환경에서의 음성명료도 향상	연결 →	**작업 소음 조건에서 활용 가능성 확인**
데이터 자산	음성·소음 데이터와 음성처리 경험	연결 →	**권한 확인 후 조건·라벨 체계를 재사용**
응용 업무	군용 무전기 AI 칩 모듈	연결 →	**작업 기록 양식·검색·인수인계 흐름**
별도 비교	**K-방산 전장 음성 데이터화 제출본 — 수집·구조화·이력 기능까지 중복 여부를 함께 대조**		

핵심 VCM의 연장 가능성은 있으나 제조 적용 성능과 신규 지원 적격성은 미확정 — 군용 무전과 제조 현장은 장비·소음·용어·목적이 다름

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개) · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

첫 검증의 범위와 확인 지표

수요처 한 곳의 작업 한 종류부터 시작하는 기획 가정

A4AI
Any For AI

기록 연결

남겨야 할 결과

작업·설비·시간과
원음·확인본 연결

확인 방법

필수 항목 누락과 원음 추적 가능 여부

업무 재사용

남겨야 할 결과

다음 근무자가 같은 상황을 찾고 인계

확인 방법

검색 성공 여부·인수인계 소요 비교

데이터 품질

남겨야 할 결과

소음 조건·수정 이력·라벨 사전

확인 방법

같은 기준으로 분류·검수 가능한지

운영 가능성

남겨야 할 결과

작업자 입력·수정·승인 절차

확인 방법

업무 중 사용 부담·책임자 피드백

목표 수치는 현장 기준선을 측정한 뒤 설정 — 지금 달성 수치처럼 제시하지 않습니다 (수요처 한 곳·작업 한 종류부터)

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

기준선 도입 전 현재 상태를 같은 방법으로 잰 값 — 개선 여부를 비교하는 출발점

A4AI
Any For AI

05

시작 준비와 실행 계획

10월에 갖출 문서와 6개월 동안 확인할 결과



개념 이미지 (AI 생성)

시작 전에 갖출 준비사항

제조·설비 기반이 없는 현재 조건에 맞춘 준비 순서

A4AI
Any For AI

수요처·업무

할 일

- 현장 후보와 작업 한 종류 선정
- 기록의 사용 목적·구매 주체 확인

완료 기준

검증 업무 정의서와 현장 담당자

제작·시험 협력

할 일

- 필요 장치·제작 범위와 외주 역할
- 제작사·시험기관 견적과 일정

완료 기준

사양 초안·역할표·시험 항목

데이터·운영

할 일

- 보유 자료 목록·권리·라벨 정리
- 수집·수정·승인·보관 절차

완료 기준

데이터 목록과 기록 양식 초안

인력·비용·지원

할 일

- 기존 과제와 신규 업무 분리
- 추가 인력 시간·비용·적격 공고

완료 기준

업무·예산 비교표와 신청 판단 근거

핵심 공간·설비 구매는 구체적인 제작 업무와 견적이 나온 뒤 검토

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

10월: 공장등록 후 계획 준비

등록 정비와 함께 현장 검증을 시작하기 위한 문서 준비

A4AI
Any For AI

현황 정리

등록 완료 여부·실제 업종·제작 가능 범위 확인

검증 계획

수요처 후보·작업 범위·데이터 목록·기록 양식

협력·지원 검토

제작·시험 역할과 견적, 기존 과제와 공고 조건 대조

10월 산출물

1. 제조 진입 계획 초안
2. 역할표
3. 데이터 목록
4. 지원사업 판단표

핵심 바로 설비를 사거나 여러 공고에 일괄 신청하는 일정이 아님 — 문서를 갖춘 뒤 다음 단계 판단

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

6개월 실행 계획

단계별 결과를 확인한 뒤 다음 범위와 비용을 조정

A4AI
Any For AI

2026.10	2026.11	2026.12	2027.01	2027.02	2027.03
핵심 준비·검증 **공장등록 후 계획 준비**	핵심 준비·검증 **수요처 협의·협력 제작 범위**	핵심 준비·검증 **작은 범위의 기록 흐름 검증**	핵심 준비·검증 **현장 결과 정리·지원사업 재검색**	핵심 준비·검증 **시제품·외주·시험 계획 구체화**	핵심 준비·검증 **확장·제작 여부 검토**
다음 판단에 필요한 결과 현황·업무 정의·데이터 목록·과제 비교표	다음 판단에 필요한 결과 현장 참여 조건·사양 초안·견적	다음 판단에 필요한 결과 수정·승인·검색 사용성, 데이터 추가 수요	다음 판단에 필요한 결과 활용 사례·남은 준비·확정 공고 조건	다음 판단에 필요한 결과 제작비·시험비·인력과 납기	다음 판단에 필요한 결과 수요·비용 근거가 있는 사업화 계획

기획 일정이며 협약·현장 조건에 따라 조정 · 2027 공고 일정은 미확정 · 진행 과제와 인력·일정 겹침 함께 조정

참고 2027년 1~4월에 되풀이되는 정기 공고(스마트공장·바우처·방산·창업 R&D)는 부록 H 달력으로 미리 준비

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안 · 기업마당·기관 공고 및 보도(2026년 실제 공고·접수일), 재정리 사이트는 원문 대조 필요

최종 결론

제조 진입의 첫 단계는 현장 수요와 데이터 활용 검증

A4AI
Any For AI

진출 방향

직접 설비 투자에 앞서,
작은 현장 업무와
협력 제작 범위를 준비

자산 활용

보유 음성·소음 데이터와
VCM을 기반으로
기록의 재사용 가능성 검토

지원사업

납품 증빙이 필요한 사업은 제외,
기획·인프라·시험 지원부터
조건 대조

후속 정리

① 수요처·업무

② 데이터·권리

③ 제작·시험 역할

④ 과제·예산 분리

핵심 설비보다 수요·데이터·역할·예산 네 가지 문서를 먼저 갖추고, 그 결과로 제작 범위를 정합니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

A4AI
Any For AI

질의응답

제조 진출 방향과 준비 범위



개념 이미지 (AI 생성)

부록 A · 준비 지원 공고의 세부 조건

기준일 2026.10.16 · 신청 직전 원문·잔여 모집 확인

A4AI
Any For AI

공고 · 주관기관	원문 핵심 조건	추가 확인·준비
경북 AX랩 포항테크노파크 우선 검토	제조 AX 서비스 사업화 의지 예비·초기 창업 / 업력 7년 이내 등 상시 모집, 3개사 내외	회사 적용 유형·상주/활용 계획·잔여석 신청서·사업자등록·참여 동의 등 준비 협약 조건과 기존 과제 인프라 사용 대조
기업애로 원스톱 에이전트 구미전자정보기술원 확인 필요	구미 사업장 가동 중소·중견기업 유사 정책자금 수행(예정) 기업 제외 단순 서비스업 등 제외	실제 업종과 신청내용의 유사성 판단 신청서·지원계획·전문가 서약·등록 서류 2027 기획은 해당 연도 접수증·완성 계획서 제출 의무

출처: 포항테크노파크, 경북AX랩 활용기업 모집 공고·신청서 · 구미전자정보기술원, 2026-294호 공고·신청서

부록 B · 기술지도·시험 지원의 세부 조건

동일제품·동일내용 또는 같은 시험 결과물을 재청구하지 않도록 대조

A4AI
Any For AI

공고 · 주관기관	조건·필요 자료	기존 과제 비교
온디바이스 AI 애로기술 한국로봇융합연구원 확인 필요	대상 산업 관련 중소·중견기업 사업계획서·참여의사·전문가 이력·사업자등록 간접지원 최대 500만 원, 수행 11.30까지	최근 2년 동일제품·동일내용 지원 제한 VCM 엔진·UGV/RISE 검증과 차이 명시 대상 기술 연관성과 잔여 모집 확인
공유공장 시험지원 FITI시험연구원 시료 준비 후	업력 5년 이내 제조창업기업 또는 중소기업 시료·시험 항목·기간·희망 장비 등 신청서 충북 우선, 타지역 가능 / 4건 충원 시 종료	기존 과제 시험계획·견적·비용과 비교 추가 시험의 목적·시료·결과물을 구분 필요 시료와 실제 시험 가능 범위 확인

출처: 한국로봇융합연구원, 2026-21호 애로기술 지원 공고·신청서 · FITI시험연구원, 공유공장 제조창업 시험지원 추가모집 공고

부록 C · 구조적 조건으로 제외·보류한 사례

제조 관련 키워드가 있어도 신청 자격과 사업 목적을 별도로 판단

공고 / 주관·수행기관	주된 사유	처리
방산·모빌리티 스마트공장 / 경북테크노파크	납품내역서·거래확인서 없음	이번 신청 제외
Multi AI Agent Jump-up / 중소기업기술정보진흥원	지정 선행 스마트제조 과제 완료 이력 미확인	증빙 전 보류
대전 3D프린팅 / 대전테크노파크	대전 산업단지·대덕특구 등 소재 조건	구미 회사 대상 제외
포항 스마트공장 / 포항테크노파크	포항 소재 기업 대상, 구미와 지역 불일치	이번 신청 제외
실외이동로봇 기술지원 / 한국로봇산업진흥원	실제 대상 로봇·시험 준비 필요 진행 UGV·RISE 시험 범위 중복 검토	시제품 준비 후 재검토

출처: 경북테크노파크, 지역특화형 방산·모빌리티 스마트공장 공고·제출서류 · 중소기업기술정보진흥원, 중소제조 특화 Multi AI Agent Jump-up Track 공고 · 대전테크노파크, 3D프린팅 시제품 제작지원 공고 · 한국로봇산업진흥원, 실외이동로봇 기술지원 모집 공고 · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개)

부록 D · 마감·기간을 다시 확인한 사례

10.16 기준 마감 7일 이하 공고는 준비 기간 부족으로 이번 검토 제외

공고 / 주관·수행기관	접수 관련 근거	처리
제조 온디바이스 AI 기술지도(별도 공고) / 구미전자정보기술원	접수 10.16 마감	다음 차수 확인
방산 중소기업 컨설팅 / 한국방위산업진흥회	10.19 마감	다음 차수 확인
경북 K-AI 컨소시엄 / 경상북도경제진흥원	10.23 마감	이번 검토 제외
2026 기업지원(9월 접수) / 구미전자정보기술원	접수 9.18 종료 — 사업 수행 11.30과 구분	마감 공고로 분리
구미 제작센터 파트너사 모집 / 구미전자정보기술원	4.27~5.8 접수, 공급 파트너 모집	수혜기업 신청과 구분

확인 상시 모집은 남은 기간·모집 건수·예산 소진 여부를 신청 직전에 다시 확인

출처: 구미전자정보기술원, 온디바이스 AI 기술지도 공고 · 경상북도경제진흥원, K-AI 경북형 컨소시엄 모집 · 한국방위산업진흥회, 4차 방산 중소기업 컨설팅 모집 · 구미전자정보기술원, 9월 기업지원 프로그램 공고

부록 E · 진행·완료·신청 상태 대조

참고자료의 수행 이력과 과제 본문을 구분해 확인

A4AI
Any For AI

구분	자료상 과제·사업	중복 검토 방법
수행 중	VCM (2026.05~12) UGV (2026.06~2027.06) RISE 자율순찰 로봇 (2026.04~12)	최신 협약·수정 계획서·집행/예정 비용을 대조
신청서 확인	K-방산 1단계 전장 음성 데이터화 선정·협약 상태는 추가 확인	선정 여부와 무관하게 제안 범위 비교 동시 신청·수행 제한은 해당 공고별 확인
과거 완료 표기	RISE 드론·LiDAR SLAM 초기창업패키지·전주기 방산 창업 등	현재 인력 참여율과 구분 과거 지원 이력·동일제품 제한에는 포함 검토
추가 확인 자료	협약서·최신 변경계획·세부 예산 기관별 중복 제한·참여 인력 투입 계획	기능·산출물·데이터·시험·인건비 비교표 확정

주의 현재 자료만으로 신규 공고의 중복 지원 적격성을 확정하지 않음

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개)

부록 F · 제조 흐름·지원사업 근거

정책 방향 자료와 실제 신청 공고를 구분

구분	자료와 원문 주소
정책 흐름	중소벤처기업부, 제조 AI 솔루션 공모전 보도자료 (2025.09.29) www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1062155&cbIdx=86…
2026 사업 체계	중소벤처기업부, 2026 스마트제조혁신 지원사업 통합공고 www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1062885&cbIdx=310&parentS…
경북 AX랩	포항테크노파크, 경북AX랩 활용기업 모집 공고·신청서 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…
구미 기획 지원	구미전자정보기술원, 2026-294호 공고·신청서 geri.re.kr/html/board_content.asp?board_id=business&board_idx=4394…
시험 지원	FITI시험연구원, 공유공장 제조창업 시험지원 추가모집 공고 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…
온디바이스 기술지도	한국로봇융합연구원, 2026-21호 애로기술 지원 공고·신청서 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…
스마트공장 제외 근거	경북테크노파크, 지역특화형 방산·모빌리티 스마트공장 공고·제출서류 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…
선행 이력 조건	중소기업기술정보진흥원, 중소제조 특화 Multi AI Agent Jump-up Track 공고 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…
지역 조건	대전테크노파크, 3D프린팅 시제품 제작지원 공고 pms.dips.or.kr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/pbanc/bIYqkzA5Pen4RaFt1…
마감 재확인	경상북도경제진흥원, K-AI 경북형 컨소시엄 모집 www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000…

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

부록 G · 판단 기준과 자료 범위

회사 현황 2026.10.16 확인 · 지원사업은 접수 직전 재확인

항목	내용
회사 조건	제조 기반·관련 납품 증빙 없음, 보유 음성·소음 데이터와 VCM 진행 현황 반영
원문 자료	VCM·UGV·자율순찰 로봇 RISE 계획서와 K-방산 제출본, 개별 공고·신청 양식
판단 범위	대표 제외 사유를 정리한 검토안 — 전체 수집 공고의 사유별 통계와 구분
제외 규칙	10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지) 공고는 준비 기간 부족으로 이번 검토 제외
확정 전 확인	K-방산 선정·협약 상태, 최신 과제 예산·업무 범위, 상시 공고 잔여 모집

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 제출본 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 작성한 기획 제안

부록 H · 다음 6개월 정기 공고 달력

해마다 되풀이되는 공고를 작년 실제 공고·접수일 기준으로 미리 준비

A4AI
Any For AI

11월 지금 접수 중	12월 스마트공장	1월 R&D·방산	2월 바우처·드론	3월 공고 집중	4월 컨설팅
실외이동로봇 기술지원 ~11.30 선착순 · 시제품 준비 후	**정부형 스마트공장 고도화** 작년 12.8~1.7 · 공장등록 + 3개년 재무제표	**경북TP 국방 중소기업 역량강화** 작년 1.20~2.6	**데이터바우처** 작년 2.27 공고~3.31	**AI바우처 수요기업** 작년 3월 공고 · 과제당 최대 2억	**방산 중소기업 컨설팅 1차** 작년 4.1~4.21
GERI 구미 스타트업 제작센터 ~11.27 · 시제품 직접 제작	**엔드이펙터 시험 (KTL)** ~12.18 · 해당 품목만	**무기체계 부품국산화 1차** 작년 1.6~1.20 · 대상 품목	**경북TP 무인비행체 사업화** 작년 2.23~3.20	**K-방산 스타트업 1차** 작년 3월	**디딤돌 R&D 3차** 작년 4.9~4.29
로봇 연구장비 임대 (KIRIA) ~12.31 · 유료 장비 임대	**방산혁신클러스터 판로** ~12.31 · 전시회 참가비	**창업도약패키지** 작년 1월 공고 · 업력 3년 초과 (1.15 이후)	**경북TP 민군협력 항공부품** 작년 2.11~2.24 · 드론 포함 문의	**경북TP 공공조달 군수품** 작년 3.6~3.19	**경북 신규 상품개발** 작년 4월(~4.20)
경북TP 국방기술 민간이전 ~11.30 · 방사청 승인 조건	**공급기업 Pool 등록** 공고 전 사전 등록	**디딤돌 R&D 1차** 작년 1월 · 7년 이하	**디딤돌 R&D 2차** 작년 2.26	**AX 원스톱 바우처 공급** 작년 3.18~4.3	**제조AI특화 스마트공장** 작년 3~4월 · 구축 이력 필요

주의 12월~4월은 2026년 실제 공고 시기 기준 예상(추정) — 규모·자격은 새 공고문으로 다시 판정

출처: 기업마당·기관 공고 및 보도(2026년 실제 공고·접수일), 재정리 사이트는 원문 대조 필요
